

要件定義書 — AI 未病予測 × 検査連携ヘルスケア導入

項目	内容
補助金事業者番号	232 R113210315
事業名	AI 未病予測 × 検査連携ヘルスケア導入
補助金種別	ものづくり補助金 第 21 次（製品・サービス高付加価値化枠）
採択決定日	令和 8 年 1 月 23 日（2026-01-23）
補助金額	1,000 万円
補助率	2/3（本事業費 1,500 万円のうち）
事業者	株式会社ウェルフォート（法人番号 3010401170017）
主な開発委託先	株式会社アンフィックスエンターテイメント（本書作成主体）
共同開発委託先	株式会社 Elith（AI 診断システム担当） / 株式会社 H&K（結合テスト・検証担当）
開発実施期間	2.5 ヶ月（10 週間） — AI 駆動開発ツール活用
想定スケジュール	2026-02-01 開発着手 → 2026-04-15 本番リリース
文書バージョン	2.1
文書日付	2026-05-28

1. 事業概要

1.1 ミッション・ビジョン

内容	
Mission	がん及び生活習慣病を、健康モニタリングにより 早期発見および予防 し、健康寿命を大幅に伸ばし、豊かな人生を実現する。
Vision	病気になる前に予防する。 健康投資があたりまえの世の中に。

1.2 事業の核心

「読ませるレポート」から「行動を促すダッシュボード」へ — 既存の検査結果報告書はテキスト中心で読解負荷が高く、ユーザーが行動に繋げにくい。本事業は最新のマルチモーダル LLM と会話型 AI 問診を駆使し、検査データを統合・解釈・要約し、ユーザーが次の一歩を踏み出せるダッシュボードへ再構成する未病予測ヘルスケアシステムを開発する。

1.3 事業の位置づけ

本事業はウェルフォート社の既存サブスク型検査サービスを基盤として、以下を実現する：

- ユーザー個別取込検査（人間ドック・健診・血液検査等）と Wellfort 経由サブスク検査（血液・遺伝子・がんリスク・AI 予測）の統合管理
- LLM を駆使した検査値の自動転記 + 5 セクションのハイブリッド型 AI 問診（音声 / テキスト）
- 取込データを Elith AI 診断システムに連携 → 個人毎の疾病予防アドバイス生成
- ユーザーへの提示は信号機カラー指標カード、緊急アラートのピン留め、デイリークエスト型 To-Do、シチュエーション別カードの 4 アプローチで認知負荷を最小化

2. 課題と解決方針

2.1 既存の課題

#	課題	影響
1	紙の検査結果の取込障壁	検査機関ごとにフォーマットが異なり、ユーザーが手入力するのは現実的でない
2	生活習慣問診の Web フォーム離脱率の高さ	設問数が多く、画面遷移が煩雑で「ウンザリ」要因
3	長尺レポートのスクロール地獄	207 ページの遺伝子検査 PDF をスマホ画面にそのまま表示するとユーザーが離脱
4	検査キット返送忘れ	配送業者連携が無く、ユーザーが受領・返送の進捗を把握しづらい
5	検査値の解釈困難	専門用語が多く、ユーザーが「自分にとって何が重要か」判断できない

2.2 解決方針

#	解決策	該当技術
1	マルチモーダル LLM (Gemini 2.5 Flash) で PDF/画像から検査値を自動抽出	視覚 + 構造化 OCR (Perception 層)

#	解決策	該当技術
2	環境適応型ハイブリッド AI 問診（音声 Live API + テキスト + 選択肢タ ップ）	Gemini 3.1 Flash Live Preview
3	3 モード表示（a）サマリー / b）要注意抜粋 / c）全編 + deep-link）	LLM 要約 + PDF embed
4	検査キット進捗ダッシュボード+ 4 段階通知	デイリークエスト UI + 通知バッ チ
5	Elith AI による疾病予防アドバイス+ 信号機カラー指標カード	Reasoning 層 / 二次抽出 LLM

3. 技術的革新性（補助金審査ポイント）

3.1 業界先行性

項目	本事業	既存サービス
検査票 OCR	マルチモーダル LLM ネイティブ（任意フォーマット対応）	専用 OCR（固定フォーマッ ト限定）
AI 問診	音声 Live API + テキスト両対応、シーン適応型	テキストのみ Web フォーム
検査値解釈	LLM ネイティブの多モーダル理解 + 監査官モードで不整合検知	人間目視・固定ルール
結果提示	行動を促すダッシュボード（4 アプローチ統合）	PDF/紙のレポート
長尺レポート 対応	3 モード表示 + deep-link で「読みたい部分」にアクセス	全文スクロールー択
多検査ソース 統合	a) ユーザー取込 / b) Wellfort 経由 / c) Elith 結果の3 ソース 統一データ層	検査ごとに別管理

3.2 技術設計のポイント

設計原則	内容
Perception と Reasoning の分離	検査票読取（Gemini 2.5 Flash）と臨床推論（Elith Gemma 4 / Qwen 3.5）を物理分離。 それぞれに適したモデル・サービスを充てる
PII と医療データの物 理分離	顧客系 Supabase（PII あり）と診断系 Supabase（匿名キー diagnostic_user_id のみ）を 2 つに分離
Markdown ファースト	AI 問通信は Markdown を一次形式とし、JSON 強制を最小化。LLM が高速・高精度に生成 可能

設計原則	内容
適材適所のモデル選択	検査票=Gemini 2.5 Flash / 音声問診=Gemini 3.1 Flash Live / 臨床推論=Elith Med-LLM
段階的構築	Phase 0（パイロット）→ Phase 1（Supabase 二分割）→ Phase 2（AWS 完全移行）で各段の API 契約を不変に保つ
公式推奨パターン遵守	Google AI / Vercel / AWS / HIPAA / 医療情報安全管理ガイドラインのベストプラクティスを採用

3.3 既存パイロット V1（アンフィックス自社投資・補助金対象外）

本事業の技術的実現可能性は、本件採択前（2025 年 12 月 ～ 2026 年 1 月）にアンフィックスエンターテインメントが**自社投資の PoC（Proof of Concept）**として**独自に実装**したパイロット V1 で**事前検証済**。

位置づけ

項目	パイロット V1（本節で説明）	本補助金事業（§6）
実施期間	採択決定前（～ 2026-01）	採択決定後（2026-02-01 ～）
用途	アンフィックスの 研究・営業用 PoC	ウェルフォート向け 本格運用基盤
費用負担	アンフィックス自社負担（補助金対象外）	補助金 + ウェルフォート自己負担
目的	技術リスクの事前検証・営業デモンストレーション	本番品質のプロダクト構築・市場投入

パイロット V1 で動作確認済の機能（技術リスク事前検証完了）

- 検査表スキャン機能（カメラ撮影 + PDF/画像アップロード、最大 4 MB、Gemini 2.5 Flash 連携、確定 Markdown 出力）
- AI 問診機能（5 セクション・音声 Live + テキスト両対応、選択肢タップ + 動的サジェスト、進捗バー + レジューム）
- 結果ダッシュボードの基本構造（グラデーション + アニメーション、モバイル最適化）
- 12 本の設計ドキュメント体系（アーキテクチャ・データ統合・認証・検査機関連携・キット進捗・Elith 連携・UI/UX 等）

→ 実装リポジトリ: `mirai-gpro/Scan-Chat-AI`（Astro + Tailwind + Vercel + Gemini API）

補助金事業への影響（= ポジティブ要因）

- 技術的不確実性が既に解消**：補助金で着手する Phase 1 本格運用基盤は「**最適化・拡張・本番品質化**」フェーズに集中可能
- 2.5 ヶ月の短期間達成の根拠**：パイロット成果 + AI 駆動開発の組合せで実現
- アンフィックスのコミットメント**：補助金採択前から自社投資で事業性を検証する強い意思（補助金事業の有効性担保）

4. 開発体制

4.1 役割分担（RACI）

業務領域	主担当（R）	説明責任（A）	相談（C）	通知（I）
事業統括	ウェルフォート	ウェルフォート	アンフィックス / Elith / H&K	—
Web アプリ実装（UI/UX）	アンフィックス	ウェルフォート	Elith	H&K
検査スキャン機能	アンフィックス	ウェルフォート	Elith（連携 I/F）	H&K
AI 問診機能	アンフィックス	ウェルフォート	Elith（連携 I/F）	H&K
ダッシュボード（4 UI）	アンフィックス	ウェルフォート	—	H&K
検査キット進捗管理	アンフィックス	ウェルフォート	Wellfort 業務	H&K
データ統合・DB	アンフィックス	ウェルフォート	Elith	H&K
認証（Google One Tap + マイナ + JPKI）	アンフィックス	ウェルフォート	—	—
Elith 連携（S3 + バッチ）	アンフィックス	ウェルフォート	Elith	H&K
AI 診断システム	Elith	Elith	アンフィックス	ウェルフォート / H&K
結合テスト	H&K	ウェルフォート	アンフィックス / Elith	—
検証（UAT）	H&K	ウェルフォート	アンフィックス	—
セキュリティ監査	外部専門家	ウェルフォート	アンフィックス	—

業務領域	主担当 (R)	説明責任 (A)	相談 (C)	通知 (I)
医療内容監修	医療顧問	ウェルフォート	Elith	アンフィックス

4.2 開発委託先の主担当者

委託先	主担当者	役割
株式会社アンフィックス エンターテインメント	PM 1 名 + シニアフルスタックエンジニア 1 名 + シニア AI/フロントエンドエンジニア 1 名	Web アプリ実装、UI/UX、DB 設計、AI 連携実装
株式会社 Elith	東大松尾研由来 AI エンジニア複数名	医療特化 LLM (Gemma 4 / Qwen 3.5) による疾病予防推論
株式会社 H&K	QA エンジニア + テスト管理者	結合テスト・UAT・受入検証

4.3 AI 駆動開発による小規模チーム編成

本事業は **AI コーディングエージェント** (Claude Code Max) および **AI 統合開発環境** (Cursor Pro / GitHub Copilot Business) を全面的に活用する。これにより従来 **4-6 名規模**の開発チームを **3 名以下の少人数編成**で実施し、**生産性 3-5 倍**を達成。**従来 12-14 ヶ月を要する規模の開発を 2.5 ヶ月 (10 週間) で完遂**することを実現する。

詳細・根拠: 別紙「見積書」§6 参照。

5. システム要件

5.1 機能要件 (5 戦略目標)


ID	機能	概要	優先度
F-1	検査データの低摩擦・高精度取込	カメラ撮影 + PDF / 画像 (JPEG / PNG / WebP / HEIC) / CSV (血液検査) のアップロード対応。Gemini 2.5 Flash で自動転記	高
F-2	Elith AI 診断システム連携	同一 AWS アカウント内、コンテナ分離。S3 経由バッチで scan_md + interrogation_md を Elith に渡し、結果 JSON を受信	高
F-3	ハイブリッド AI 問診	5 セクション (嗜好品・運動・食生活・睡眠・心身)、音声 Live + テキスト・選択肢タップ・動的サジェスト、進捗バー + レジューム	高

ID	機能	概要	優先度
F-4	行動を促すダッシュボード	4 UI アプローチ（プログレッシブ・ディスクロージャー / アクション・タスク化 / 対話型ヘルスコーチ / シチュエーション別カード）	高
F-5	検査データ推移可視化	LLM が重要指標を判定し、血糖値・血圧・体脂肪等をグラフ化。アドバイスと並列表示	中
F-6	検査キット進捗管理	キット内容・配送予定（今回+次回）・出荷日・伝票番号・受取/返送自己申告・検査完了確認、4 段階通知（N1-N7）	中
F-7	3 モード表示（長尺レポート対応）	a) サマリー / b) 要注意抜粋 / c) 全編 + deep-link。遺伝子検査 207pg・AI 予測 9pg 等に自動適用（5pg 以上）	中
F-8	認証（Google One Tap + 将来マイナ+JPKI）	HP マイページからの再認証必須。Phase 2 でマイナ + JPKI ボタン活性化	高

5.2 非機能要件

区分	要件
パフォーマンス	スキャン → Markdown 生成 P95 < 15 秒 / 問診音声レイテンシ < 1.5 秒 / Realtime 同期遅延 < 1.5 秒
可用性	月間稼働率 99.5% 以上（Vercel + Supabase SLA）
同時接続数	Phase 1: 1,000 ユーザー同時、Phase 2: 10,000 ユーザー同時
スループット	スキャン処理 1 日 1,000 件、AI 問診同時セッション 100 件
データ容量	1 ユーザー 100 MB 上限（PDF 原本 + scan_md + 問診ログ + 診断結果）
セキュリティ	通信 SSL/TLS、保存時暗号化（Supabase / AWS KMS）、PII 物理分離、HMAC 署名
コンプライアンス	個人情報保護法、医療情報安全管理ガイドライン（3 省 2 ガイドライン）、HIPAA 適合性
データ主権	asia-northeast1（東京）リージョン優先、Phase 2 AWS 移行で完全国内化
監査ログ	10 年保管、SHA-256 改竄検知
対応 OS/ブラウザ	iPhone Safari iOS 16+（最優先） / iPad / Android Chrome 直近 2 版 / Mac Safari/Chrome / Windows Edge/Chrome 直近 2 版
アクセシビリティ	WCAG AA 準拠

5.3 システムアーキテクチャ

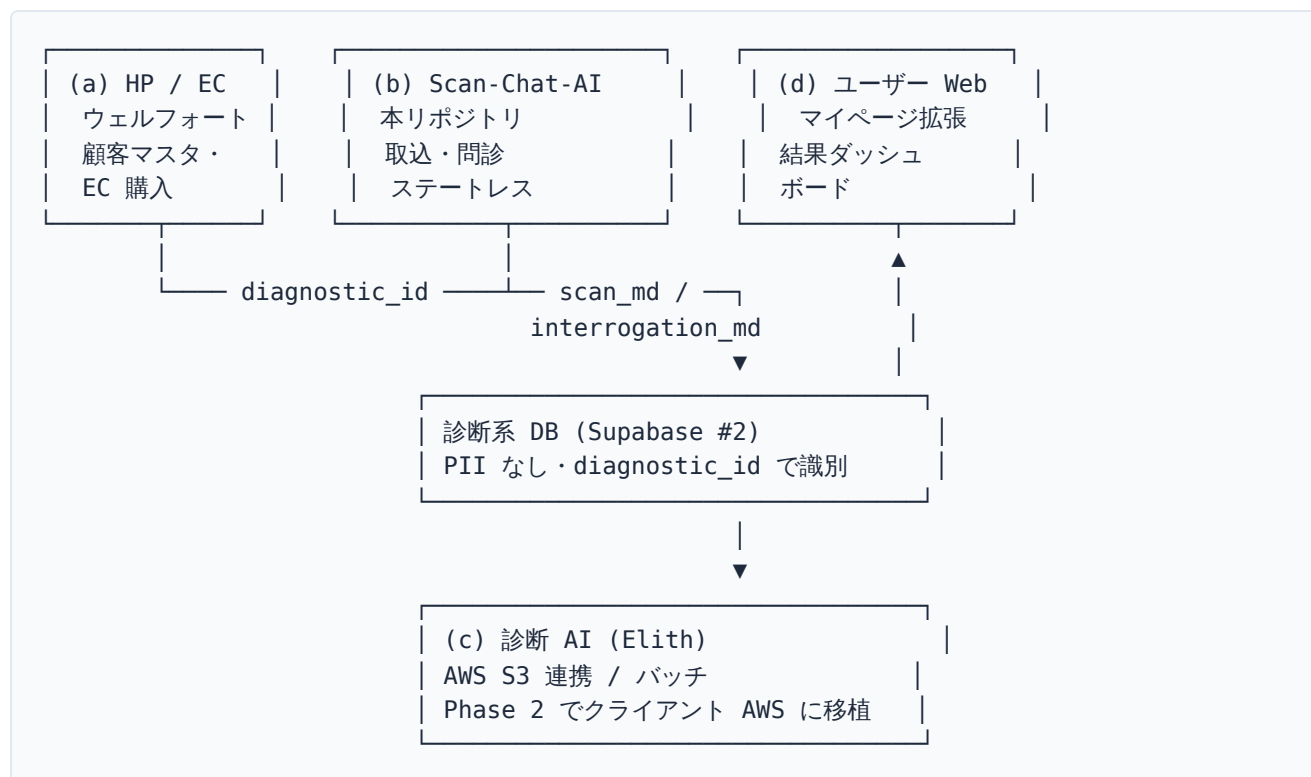

5.4 データモデル（主要テーブル）

テーブル	配置	用途
customer_profiles	顧客系 (PII あり)	HP/EC 既存。氏名・住所・生年月日
lab_companies	顧客系	検査会社マスタ
kit_shipments	顧客系	検査キット出荷・進捗
lab_tests	顧客系	検査 ID ↔ 顧客 ID 紐付け
lab_intake_files	顧客系	検査機関からの原本 PDF (PII あり)
subscriptions / subscription_plans	顧客系	サブスク契約
notifications	顧客系	4 段階通知キュー
app_users	診断系 (PII なし)	diagnostic_user_id のみ
test_artifacts	診断系	a/b 統一 scan_md (5 検査種別)
test_artifact_files	診断系	物理ファイル参照 (PDF redacted / scan_md / summary_md / highlights_md)

テーブル	配置	用途
test_artifact_items	診断系	a/b の項目データ + c) deep-link 用
diagnosis_results	診断系	Elith 結果 JSON 保管
diagnosis_result_items	診断系	ダッシュボード 4 UI への二次抽出項目
sessions / messages	診断系	AI 問診履歴
audit_logs	監査系	10 年保管

5.5 連携先

連携先	I/F	主要データ
Wellfort HP/EC	Edge Function (verify-eligibility / get-customer-profile)	入場資格チェック、顧客情報取得
Google One Tap	クライアント SDK + Supabase Auth	認証 (FedCM 対応)
Gemini API	サーバ HTTPS + WebSocket	OCR + 音声問診
検査機関 (リージャー / PREVENT / ジェノプラン / LAiF)	SFTP / メール添付 / API webhook / 手動 UL (Workflow 1/2/3)	検査結果 PDF / CSV
Elith AI	AWS S3 + バッチ + webhook (diagnosis-ai-callback)	scan_md / interrogation_md → 診断結果 JSON
配送業者 (Phase 2)	API 連携	配送状況
マイナ + JPKI (Phase 2)	公的個人認証サービス	追加認証

6. 開発スコープ (本事業の対象)

6.1 補助金対象スコープ (Phase 1 本格運用基盤)

- F-1～F-8 全機能の本格実装
- 顧客系 + 診断系 Supabase 2 分割の構築 + 全テーブル展開
- Elith 連携 (バッチ + webhook) 実装
- 検査会社 4 社との連携 (Workflow 1/2/3 主軸: 検査ID 逆引き方式)
- 4 段階通知システム
- 4 UI アプローチ全実装 + 3 モード表示
- マイページからの認証連携 (Google One Tap)
- 結合テスト・UAT・セキュリティ監査・医療内容監修

6.2 補助金対象外 — アンフィックス自社投資分（実施済）

項目	状況	費用負担
パイロット V1 (PoC) — 検査スキャン + AI 問診 + 設計ドキュメント体系	2026-01 までに 実装済	アンフィックス自社負担（研究・営業用 PoC として）

→ 詳細工数・金額：別紙「見積書」 § 8

6.3 補助金対象外 — Phase 2 以降の将来拡張

- AWS 完全移行（Phase 2 で別途調達）
- マイナ + JPKI 追加認証（Phase 2 で別途調達）
- Document AI Custom Extractor 導入（Phase 2 で別途調達）
- 配送業者 API 連携（Phase 2 で別途調達）

7. スケジュール

開発実施期間 2.5 ヶ月（10 週間）+ 運用・効果検証期間 5.5 ヶ月 = 補助金事業期間 約 9 ヶ月。AI 駆動開発で早期に稼働させ、残期間を実証・改善ループに充てる。

7.1 全体タイムライン

期間	フェーズ	主な成果物
2026-01-23	補助金交付決定	（採択済）
2026-02-01 ~ 2026-04-15	開発実施期間（2.5 ヶ月 / 10 週間）	全機能 F-1~F-8 実装・テスト・本番リリース
2026-04-16 ~ 2026-09-30	運用・効果検証期間（5.5 ヶ月）	ベータ運用 → 本番ユーザー受入 → 機能改善ループ → 売上計上
2026-10 月以降	補助金完了報告	効果検証データ + 売上実績を添付

7.2 開発実施期間（2.5 ヶ月）の週次計画

週	フェーズ	主な成果物
W1-W2（2026/02 1-2 週）	詳細設計	機能仕様 / DB マイグレーション / API 契約 / セキュリティ設計 / テスト計画
W3-W5（2026/02 3 週 - 2026/03 1 週）	基盤実装 + コア機能	Supabase 2 分割 / 認証 / Edge Function / F-1 検査スキャン本格化 / F-3 AI 問診本格化 / F-6 検査キット進捗

週	フェーズ	主な成果物
W6-W7 (2026/03 2-3 週)	拡張機能・連携	F-2 Elith 連携 / F-4 ダッシュボード 4 UI / F-5 推移グラフ / F-7 3 モード表示
W8 (2026/03 4 週)	結合テスト	H&K による結合テスト・E2E テスト
W9 (2026/04 1 週)	セキュリティ監査・医療内容監修	外部セキュリティ監査 / 医師・薬剤師レビュー
W10 (2026/04 2 週)	UAT・本番リリース	ベータユーザーテスト / 本番デプロイ / 運用マニュアル整備

7.3 主要マイルストーン

MS	日付	内容
MS-1	2026-02-15	詳細設計完了・承認 (受注 +2 週)
MS-2	2026-03-08	基盤実装完了 (受注 +5 週)
MS-3	2026-03-22	F-1 / F-3 / F-6 完成 (受注 +7 週)
MS-4	2026-04-05	F-2 / F-4 / F-5 / F-7 完成 (受注 +9 週)
MS-5	2026-04-12	結合テスト・セキュリティ監査完了 (受注 +9.5 週)
MS-6	2026-04-15	UAT 完了・本番リリース・開発事業完了 (受注 +10 週)

7.4 早期事業化のメリット

AI 駆動開発で**2.5 ヶ月**で本番稼働させ、補助金事業期間内の**残 5.5 ヶ月**を運用検証 + 機能改善 + **売上実績計上**に活用。これにより:

- 補助金完了報告時に**実売上データ**を添付可能 → 補助金事業の有効性を定量的に示せる
- ユーザーフィードバックを早期に反映した品質向上ループ
- 市場投入の早期化による競合優位性確保

8. 投資内訳サマリ

詳細: 別紙「見積書」(docs/funding_application/見積書.md) を参照。

8.1 補助金事業の経費内訳 (本見積)

大項目	金額 (税込)	補助対象
1. 機械装置・システム構築費	9,500,000 円	○

大項目	金額（税込）	補助対象
2. クラウドサービス + AI 開発支援ツール利用費	1,200,000 円	○
3. 専門家経費	1,800,000 円	○
4. 外注費	2,000,000 円	○
5. 知的財産権関連費	500,000 円	○
合計事業費	15,000,000 円	
補助金額	10,000,000 円	（補助率 2/3）
ウェルフォート自己負担額	5,000,000 円	

8.2 補助金対象外（アンフィックス自社投資・参考表示）

項目	工数（市場価値換算）	費用負担
パイロット V1（PoC、研究・営業用）ー 実施済	5,000,000 円相当	アンフィックス自社負担

→ 本補助金事業着手前（2026-01 まで）にアンフィックスが自社投資で完了した PoC。技術リスク事前検証 + 営業デモンストレーション用途。

8.3 事業全体の投資総額（参考）

主体	金額（税込）
国（ものづくり補助金）	10,000,000 円
ウェルフォート自己負担	5,000,000 円
アンフィックス自社投資（パイロット V1）	5,000,000 円
総事業価値	20,000,000 円

→ 補助金（50%）+ 受発注両社の自己投資（50%）で構成される、官民協調による事業推進体制。

9. 期待効果・売上計画

9.1 定量目標（3 年計画）

指標	1 年目	2 年目	3 年目
月間アクティブユーザー（MAU）	1,000	5,000	20,000

指標	1 年目	2 年目	3 年目
年間売上高（ウェルフォート）	6,000 万円	3 億円	12 億円
検査キット販売数（年）	3,000	15,000	60,000
ユーザー継続率（年次更新）	60%	70%	75%

9.2 定性効果

- ユーザーの健康投資意識の向上（検査受診率の向上）
- 生活習慣病の早期発見率向上（シミュレーション上 15-20% 増）
- ユーザー離脱率の低減（Web フォーム比 1/3 を目標）
- 医療従事者との情報共有負荷軽減（構造化レポート提供）

10. リスクと対策

リスク	影響	緩和策
Gemini API のクォータ制限	スキャン処理停止	Tier 1 課金 + Vertex AI 移行プラン用意
Live API のレイテンシ悪化	問診体験低下	別 LLM (GPT-4o / Claude) フォールバック設計
検査会社の配信フォーマット変更	取込失敗	Workflow 3 (人間承認) フォールバック + 自動再学習
LLM ハルシネーション	誤った健康助言	「読み取った値 vs 推論値」分離 + 出典付き表示 + 医療顧問監修
PHI 漏洩	法令違反	PII 物理分離 + HMAC 署名 + 監査ログ 10 年 + 暗号化
検査キット返送遅延	サブスク顧客離脱	4 段階通知 + デイリークエスト UX で行動誘導
Elith 仕様変更	連携停止	schema_version 管理 + 旧フォーマット互換
開発遅延	補助金事業期間超過	月次進捗報告 + 早期 MS 失敗時の再計画フロー

11. 関連設計文書

本要件定義書は以下の詳細設計文書を前提とする：

文書	内容
wellfort_app_design_concept.md	Mission/Vision、5 戦略目標、4 UI アプローチ、3 モード表示、3 入力データソース
system_architecture_overview.md	4 コンポーネント分離・設計ポリシー・段階構築・インフラ配置
data_integration_requirements.md	ユーザー ID 連携・Edge Function 群・PII 分離原則
device_and_auth_requirements.md	Google One Tap + マイナ+JPKI ロードマップ・デバイス対応
diagnostic_session_data_spec.md	scan_md / interrogation_md / diagnostic_result JSON フォーマット
lab_integration_workflow.md	検査機関連携 Workflow 1/2/3 + PII 除去 + 監査
test_data_storage_and_db_design.md	ファイルストレージ階層 + DB 全テーブル定義
kit_progress_management.md	キット進捗ダッシュボード + 4 段階通知
elith_report_integration.md	Elith JSON 受信 + 3 モード割当 + ダッシュボード変換
scan_feature_requirements.md	スキャン機能詳細要件
ai_app_ui_ux_proposal.pdf	ダッシュボード UI/UX 提案書
scan_chat_medical_ai_proposal.pdf	スキャン/問診の UI/UX 提案書

すべて本リポジトリ `mirai-gpro/Scan-Chat-AI` の `docs/` 配下に格納済。

12. 添付資料

#	内容
添付 1	見積書（ <code>docs/funding_application/見積書.md</code> ）
添付 2	パイロット版 動作確認画面（本リポジトリ <code>docs/kensa_sample/</code> + <code>ai_app_ui_ux_proposal.pdf</code> ）
添付 3	既存設計文書一式（上記第 11 章リスト）

13. 改訂履歴

Ver	日付	内容	作成者
1.0	2026-05-28	初版。ものづくり補助金 21 次・補助金事業者番号 232 R113210315・採択決定令和 8 年 1 月 23 日・補助金額 1,000 万円（補助率 2/3、事業費総額 1,500 万円）想定で作成	株式会社 アンフィックス エンターテインメント
2.0	2026-05-28	AI 駆動開発（Claude Code Max / Cursor Pro / GitHub Copilot Business）で 開発実施期間を 14 ヶ月 → 2.5 ヶ月（10 週間） に圧縮。§ 4.3 「AI 駆動開発による小規模チーム編成」を新設、§ 7 スケジュールを週次計画 + MS-1～MS-6 を 2026-02-15～2026-04-15 に圧縮、§ 7.4 「早期事業化のメリット」を追加（補助金事業期間内に実売上データを計上可能）	株式会社 アンフィックス エンターテインメント
2.1	2026-05-28	パイロット V1 を補助金対象外として明確に分離 。§ 3.3 を「パイロット V1（アンフィックス自社投資・補助金対象外）」に再構成し、本補助金事業との位置づけ比較表 + 事前検証完了による Phase 1 への影響を明示。§ 6.2 「補助金対象外 — アンフィックス自社投資分」を追加（Phase 2 拡張分は § 6.3 に分離）。§ 8 投資内訳サマ리를 8.1/8.2/8.3 に分割し 事業全体投資総額 （補助金 10M + ウェルフォート 5M + アンフィックス 5M = 20M 、官民協調体制）を明示	株式会社 アンフィックス エンターテインメント
